

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL - TF 10/2024 - MAIO 2025

De 01/05/2025 a 31/05/2025

Parceria: TF 010/2024 - Associação Comunitária Nossa Senhora do Carmo - ANOSCAR - FOMENTO SAS

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

As metas, resultados e impactos estão alinhados com a melhoria da infraestrutura física e social do espaço, criando um ambiente mais seguro, acessível e atrativo para a comunidade.

No segundo quadrimestre esta voltada para o execução do cronograma de adequação do espaço.

Ações:

- Implantar melhorias no espaço físico com base em 100% das sugestões coletadas em pesquisas de satisfação e parâmetros técnicos e profissionais de arquitetura e engenharia.
- Criar e equipar novos espaços.
- Realizar manutenções preventivas das estruturas existentes.
- Reduzir incidentes de segurança, com a garantia da acessibilidade em todas as áreas.

2| Resultados Alcançados

- Maior engajamento comunitário nas oficinas semanais.
- Melhoria na percepção da segurança e funcionalidade do espaço externo pelos participantes.
- Redução de custos futuros com manutenções corretivas devido à implementação de manutenções preventivas.
- Ampliação dos públicos atendidos em situação de vulnerabilidade.
- Espaços físicos mais adequados, inclusivos e atrativos para a realização de ações socioassistenciais.

3| Impacto das Ações nos Indicadores da Parceria

- Indicador de Participação: Aumento do número de participantes ativos por oficinas.
- Indicador de Segurança: Diminuição de incidentes registrados.

- Indicador de Acessibilidade: Melhora na acessibilidade das estruturas externas.
- Indicador de Satisfação: Elevação do índice de satisfação dos participantes em avaliações realizadas após as oficinas.
- Indicador de Engajamento: Aumento na frequência de participantes retornando às oficinas.

☰ Atividades Desenvolvidas

1 | Compra de materiais, contratação de mão de obra e início da adequação do espaço físico.

Completude: 20

%

Objetivo Específico: Desenvolver planejamento adequado as melhorias do espaço físico

Atividades: Desenvolver atividades em formato de Oficinas semanais no espaço

Descrição:

Preparo do espaço e chegada dos materiais.

Pontos de Atenção:

Atrasos na entrega de materiais.

Encaminhamentos:

Finalização para início de projeto de melhorias do espaço.

2 | Uso limitado ao espaço interno para as atividades.

Completude: 0 %

Objetivo Específico: Garantir a segurança e conservação do espaço externo para o desenvolvimento de ações socio assistências;

Atividades: Adicionar o número de espaços adequados na unidade para a realização de oficinas

Descrição:

Uso do salão, salas técnicas e salas de atividades no espaço interno.

Pontos de Atenção:

Garantir a viabilidade e segurança dos usuários nas atividades.

Encaminhamentos:

Manutenção do serviço, independente das atividades de melhorias no espaço externo.

3 | Uso limitado ao espaço interno para as atividades.

Completude: 0 %

Objetivo Específico: Promover acessibilidade e ampliação de uso do espaço externo para atividades;

Atividades: Ampliar o número de participantes nas oficinas realizadas

Descrição:

Uso do salão, salas técnicas e salas de atividades no espaço interno.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Realização de atividades de convivência no espaço interno.

 [Indicadores de Parceria](#)

 [Indicadores de Parceria](#)

13º Mês | MAI/2025

1 | Número de usuários cadastrados/Capacidade total de cadastros do CCINTER

Descrição: Descritivo de capacidade total de cadastros do serviço;

Quantidade 0

Realizado no Mês: 200 (0%) | Não Realizado

Observações: Contatos para acompanhamento.

2 | Oficinas Semanais

Descrição: Mapa de Oficinas Semanais Ocupando as Salas do CCINTER

Quantidade 0

Realizado no Mês: 25 (0%) | Não Realizado

Observações: O número de usuários cadastrados ou capacidade só serão mensuradas após elaboração detalhada do projeto, assim como a execução de parte das ações;

3 | Áreas / Salas Adequadas para Atividades


Descrição: Descritivo de Áreas / Salas Adequadas para Atividades

Quantidade 0

Realizado no Mês: 4 (0%) | Não Realizado

Observações:

 [Galeria de Fotos](#)

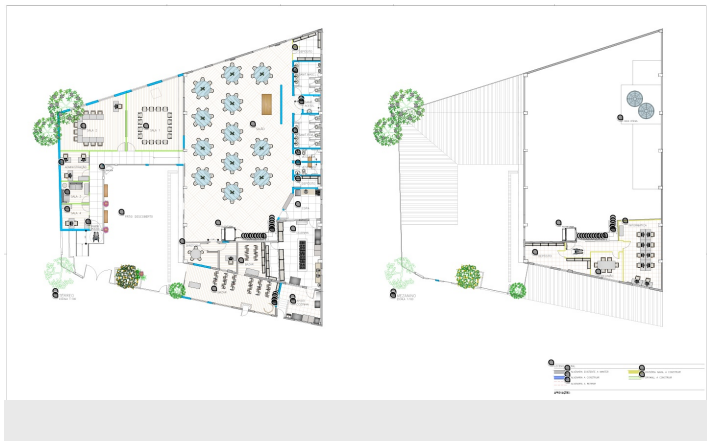

Item	Atividade Principal	Maio				Junho				Julho				Agosto				Setembro			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
IMPLANTACAO																					
1	1.1 Instalação de obra e planejamento																				
2	2.1 Lista de materiais para compra																				
3	3.1 Corte e levantamento da obra																				
4	4.1 Construção de tipologias																				
PRELIMINAR																					
1	1.1 Acerto do nível do piso externo																				
2	2.1 Marcação de alvenaria																				
3	3.1 Corte e nível das bases																				
4	4.1 Alvenaria e concretagem das blocos																				
5	5.1 Corte e nível das vigas																				
6	6.1 Corte e nível das vigas																				
7	7.1 Impermeabilização base da																				
8	8.1 Corte e nível do telhado																				
9	9.1 Concretagem pilares																				
10	10.1 Corte e nível do telhado																				
11	11.1 Alvenaria sobre estruturas T2																				
12	12.1 Instalação de paredes bloco estrutural																				
13	13.1 Vergalhões vergas com canalistas de concreto																				
14	14.1 Corte de alvenaria com canalistas de concreto																				
15	15.1 Acerto de cotagem no cinto externo																				
16	16.1 Acerto nível caixa sistema																				
17	17.1 Corte e nível das estruturas																				
18	18.1 Adequação de rios de paredes e																				
19	19.1 Corte e nível do telhado																				
20	20.1 Corte e nível das estruturas																				
21	21.1 Instalação de rios																				
22	22.1 Instalação de rios																				
23	23.1 Instalação de rios																				
24	24.1 Instalação de rios																				
25	25.1 Instalação de rios																				
26	26.1 Instalação de rios																				
27	27.1 Instalação de rios																				
28	28.1 Instalação de rios																				
29	29.1 Instalação de rios																				
30	30.1 Instalação de rios																				
31	31.1 Instalação de rios																				
32	32.1 Instalação de rios																				
33	33.1 Instalação de rios																				
34	34.1 Instalação de rios																				
35	35.1 Instalação de rios																				
36	36.1 Instalação de rios																				
37	37.1 Instalação de rios																				
38	38.1 Instalação de rios																				
39	39.1 Instalação de rios																				
40	40.1 Instalação de rios																				
41	41.1 Instalação de rios																				
42	42.1 Instalação de rios																				
43	43.1 Instalação de rios																				
44	44.1 Instalação de rios																				
45	45.1 Instalação de rios																				
46	46.1 Instalação de rios																				
47	47.1 Instalação de rios																				
48	48.1 Instalação de rios																				
49	49.1 Instalação de rios																				
50	50.1 Instalação de rios																				
51	51.1 Instalação de rios																				
52	52.1 Instalação de rios																				
53	53.1 Instalação de rios																				
54	54.1 Instalação de rios																				
55	55.1 Instalação de rios																				
56	56.1 Instalação de rios																				
57	57.1 Instalação de rios																				
58	58.1 Instalação de rios																				
59	59.1 Instalação de rios																				
60	60.1 Instalação de rios																				
61	61.1 Instalação de rios																				
62	62.1 Instalação de rios																				
63	63.1 Instalação de rios																				
64	64.1 Instalação de rios																				
65	65.1 Instalação de rios																				
66	66.1 Instalação de rios																				
67	67.1 Instalação de rios																				
68	68.1 Instalação de rios																				
69	69.1 Instalação de rios																				
70	70.1 Instalação de rios																				
71	71.1 Instalação de rios																				
72	72.1 Instalação de rios																				
73	73.1 Instalação de rios																				
74	74.1 Instalação de rios																				
75	75.1 Instalação de rios																				
76	76.1 Instalação de rios																				
77	77.1 Instalação de rios																				
78	78.1 Instalação de rios																				
79	79.1 Instalação de rios																				
80	80.1 Instalação de rios																				
81	81.1 Instalação de rios																				
82	82.1 Instalação de rios																				
83	83.1 Instalação de rios																				
84	84.1 Instalação de rios																				
85	85.1 Instalação de rios																				
86	86.1 Instalação de rios																				
87	87.1 Instalação de rios																				
88	88.1 Instalação de rios																				
89	89.1 Instalação de rios																				
90	90.1 Instalação de rios																				
91	91.1 Instalação de rios																				
92	92.1 Instalação de rios																				
93	93.1 Instalação de rios																				
94	94.1 Instalação de rios																				
95	95.1 Instalação de rios																				
96	96.1 Instalação de rios																				
97	97.1 Instalação de rios																				
98	98.1 Instalação de rios																				
99	99.1 Instalação de rios																				
100	100.1 Instalação de rios																				

Outros Documentos

Nome	Observações
ANC-EP-04-Layout1.pdf	
FASE I - Cronograma.PDF	

Próximas Atividades

#	Atividade</
---	-------------

Conceição Ferreira Hipólito

Conceicao Ferreira Hipólito
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente
CPF ***.343.438-**
RG **.17.02*-*

C. Piteri

Claudia Fernanda Piteri
Responsável Técnico
CPF ***.042.678-**
RG
