

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL - TF 97/2024 - REF. JULHO 2025

De 01/07/2025 a 31/07/2025

Parceria: TF 097/2024 - Associação Comunitária Nossa Senhora do Carmo - ANOSCAR - CMI

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

Execução do cronograma de adequação do espaço.

- Efetividade na distribuição dos espaços em atenção as normativas vigentes para a modalidade, garantindo conforto e acessibilidade aos usuários e funcionários.
- Adequação dos espaços de acordo com as necessidades do serviço.
- Ampliação de atendimento em oficinas simultaneas.
- Aumento do quadro de atividades.

2| Resultados Alcançados

- Garantia de conforto e privacidade nas ações.
- Melhoria na percepção da segurança e funcionalidade do espaço externo pelos participantes.
- Melhoria na acolhida, escuta e desenvolvimento estratégico de ações.

3| Impacto das Ações nos Indicadores da Parceria

- Indicador de segurança: Maior acessibilidade nos espaços com conforto e segurança aos usuários.
- Indicador de acessibilidade: Adaptação dos espaços em atenção as normativas vigentes.
- Indicador de participação: Adequação do espaço para o desenvolvimento das ações com aumento de número de participantes.
- Indicador de Satisfação: Aprovação dos participação em avaliações do período.

1 | Solicitação de orçamentos junto a fornecedores

Completude: 10
%

Objetivo Específico: Readequar os banheiros para maior usabilidade dos usuários e funcionários.

Atividades: Possibilitar, a partir da readequação do espaço dos banheiros, maior usabilidade, conforto e segurança dos usuários e funcionários.

Descrição:

Orçamentos de Serviço de Pessoa Jurídica para Engenharia/Arquitetura; Material de Consumo para Manutenção e Reparos;

Pontos de Atenção:

Estudo de viabilidade considerando a limitação do recurso diante da demanda.

Encaminhamentos:

Busca de novas parcerias para plena execução do projeto.

2 | Início da construção de estruturas (paredes) e solicitação de podas das árvores circundantes ao espaço.

Completude: 45
%

Objetivo Específico: Melhoria da sala técnica (orientadoras), sala de coordenação do SCFV e sala de atividades técnicas (serviço social).

Atividades: Garantir maior número de atendimentos individuais e desenvolvimento técnico das ações.

Descrição:

Articulação com a secretaria do meio ambiente e execução das estruturas.

Pontos de Atenção:

Atraso da poda das árvores.

Encaminhamentos:

Conclusão das estruturas e podas de árvores.

3 | Início da construção de estruturas (paredes) e solicitação de podas das árvores circundantes ao espaço.

Completude: 45
%

Objetivo Específico: Ampliação e readequação de 2 salas destinadas a atividades em grupo e do salão.

Atividades: Garantir espaço ampliado, confortável e acessível aos usuários nas atividades em grupos e nas ações ampliadas com família e comunidade.

Descrição:

Articulação com a secretaria do meio ambiente e execução das estruturas.

Pontos de Atenção:

Atraso da poda das árvores.

Encaminhamentos:

Conclusão das estruturas e podas de árvores.

4 | Uso restrito ao espaço interno (salão) para as atividades.

Completo: 0 %

Objetivo Específico: Ampliar o número de usuários por atividade, em ações simultâneas e diversificadas.

Atividades: Garantir ampliação do número de oficinas e usuários nas atividades.

Descrição:

Uso do salão, salas técnicas e salas de atividades no espaço interno.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Realização de atividades de convivência no espaço interno.

 Indicadores de Parceria

 Indicadores de Parceria

10º Mês | JUL/2025

1 | 1 banheiro feminino com 4 cabines adaptadas;

Descrição: Efetividade na distribuição dos espaços em atenção as normativas vigentes para a modalidade, garantindo conforto e acessibilidade aos usuários e funcionários.

Quantidade 4

Realizado no Mês: 0 (0%) | Não Realizado

Observações: Busca de novas parcerias para plena execução do projeto.

2 | 1 banheiro masculino com 2 cabines adaptadas e 2 mictórios;

Descrição: Efetividade na distribuição dos espaços em atenção as normativas vigentes para a modalidade, garantindo conforto e acessibilidade aos usuários e funcionários.

Quantidade 4

Realizado no Mês: 0 (0%) | Não Realizado

Observações: Busca de novas parcerias para plena execução do projeto.

3 | 1 banheiro unissex com acessibilidade;

Descrição: Efetividade na distribuição dos espaços em atenção as normativas vigentes para a modalidade, garantindo conforto e acessibilidade aos usuários e funcionários.

Quantidade 1

Realizado no Mês: 0 (0%) | Não Realizado

Observações: Busca de novas parcerias para plena execução do projeto.

4 | 2 banheiros vestiários para funcionários;

Descrição: Efetividade na distribuição dos espaços em atenção as normativas vigentes para a modalidade, garantindo conforto e acessibilidade aos usuários e funcionários.

Quantidade 2

Realizado no Mês: 0 (0%) | Não Realizado

Observações: Busca de novas parcerias para plena execução do projeto.

5 | 2 salas melhor adaptadas as necessidades do serviço no desenvolvimento de atividades em grupo e melhor aproveitamento do salão ampliando sua capacidade na recepção de usuários, familiares e comunidade.

Descrição:

Quantidade 2

Realizado no Mês: 0 (0%) | Não Realizado

Observações: Sala de atividades com espaço ampliado e confortável, com aumento capacidade por oficinas.

6 | Apresentação de relatório fotográfico.

Descrição:

Quantidade 1

Realizado no Mês: 0 (0%) | Não Realizado

Observações: Em andamento o processo de adequação do espaço

7 | Apresentação do quadro de atividades ampliado.

Descrição:

Quantidade 1

Realizado no Mês: 0 (0%) | Não Realizado

Observações: Em planejamento a ampliação da oferta de atividades simultâneas, tendo em vista as melhorias no espaço, garantindo conforto e privacidade nas ações.

8 | Melhoria Sala Coordenação SCFV

Descrição: Salas adequadas ao desenvolvimento das ações em funcionamento;

Quantidade 1

Realizado no Mês: 0 (0%) | Não Realizado

Observações: Em andamento o processo de adequação do espaço

9 | Melhoria Sala Técnica (Orientadoras)

Descrição: Salas adequadas ao desenvolvimento das ações em funcionamento;

Quantidade 1

Realizado no Mês: 0 (0%) | Não Realizado

Observações: Em andamento o processo de adequação do espaço

10 | Melhoria Sala de Atividades Técnicas (Serviço Social)

Descrição: Salas adequadas ao desenvolvimento das ações em funcionamento;


Quantidade 1

Realizado no Mês: 0 (0%) | Não Realizado

Observações: Em andamento o processo de adequação do espaço

 Galeria de Fotos



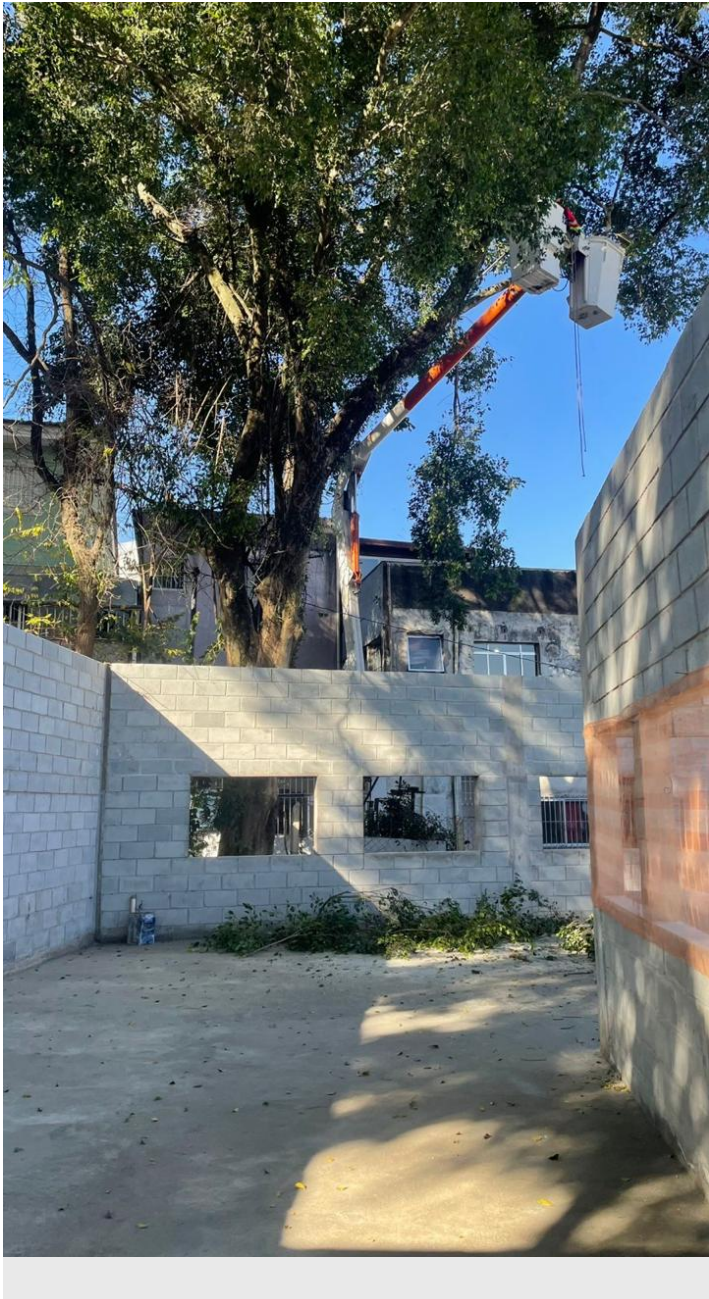

 Outros Documentos

Nome	Observações	
------	-------------	--

 Próximas Atividades

#	Atividade	Meta	Etapa	Descrição
---	-----------	------	-------	-----------



Conceicao Ferreira Hipólito

Autoridade Máxima da Entidade - Presidente

CPF ***.343.438-**

RG **.17.02*-*



Claudia Fernanda Piteri

Responsável Técnico

CPF ***.042.678-**

RG
