

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL - TF 97/2024 - REF. MAIO 2025

De 01/05/2025 a 31/05/2025

Parceria: TF 097/2024 - Associação Comunitária Nossa Senhora do Carmo - ANOSCAR - CMI

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

Execução do cronograma de adequação do espaço.

- Efetividade na distribuição dos espaços em atenção as normativas vigentes para a modalidade, garantindo conforto e acessibilidade aos usuários e funcionários.
- Adequação dos espaços de acordo com as necessidades do serviço.
- Ampliação de atendimento em oficinas simultaneas.
- Aumento do quadro de atividades.

2| Resultados Alcançados

- Garantia de conforto e privacidade nas ações.
- Melhoria na percepção da segurança e funcionalidade do espaço externo pelos participantes.
- Melhoria na acolhida, escuta e desenvolvimento estratégico de ações.

3| Impacto das Ações nos Indicadores da Parceria

- Indicador de segurança: Maior acessibilidade nos espaços com conforto e segurança aos usuários.
- Indicador de acessibilidade: Adaptação dos espaços em atenção as normativas vigentes.
- Indicador de participação: Adequação do espaço para o desenvolvimento das ações com aumento de número de participantes.
- Indicador de Satisfação: Aprovação dos participação em avaliações do período.

1 | Solicitação de orçamentos junto a fornecedores

Completude: 10

%

Objetivo Específico: Readequar os banheiros para maior usabilidade dos usuários e funcionários.

Atividades: Possibilitar, a partir da readequação do espaço dos banheiros, maior usabilidade, conforto e segurança dos usuários e funcionários.

Descrição:

Orçamentos de Serviço de Pessoa Jurídica para Engenharia/Arquitetura; Material de Consumo para Manutenção e Reparos;

Pontos de Atenção:

Estudo de viabilidade considerando a limitação do recurso diante da demanda.

Encaminhamentos:

Busca de novas parcerias para plena execução do projeto.

2 | Compra de materiais, contratação de mão de obra para adequação do espaço físico

Completude: 20

%

Objetivo Específico: Melhoria da sala técnica (orientadoras), sala de coordenação do SCFV e sala de atividades técnicas (serviço social).

Atividades: Garantir maior número de atendimentos individuais e desenvolvimento técnico das ações.

Descrição:

Preparo do espaço e chegada dos materiais.

Pontos de Atenção:

Atraso na entrega de materiais.

Encaminhamentos:

Finalização da compra para início de projeto de melhorias do projeto.

3 | Compra de materiais, contratação de mão de obra para adequação do espaço físico

Completude: 20

%

Objetivo Específico: Ampliação e readequação de 2 salas destinadas a atividades em grupo e do salão.

Atividades: Garantir espaço ampliado, confortável e acessível aos usuários nas atividades em grupos e nas ações ampliadas com família e comunidade.

Descrição:

Preparo do espaço e chegada dos materiais.

Pontos de Atenção:

Atraso na entrega de materiais.

Encaminhamentos:

Finalização da compra para início de projeto de melhorias do projeto.

4 | Uso restrito ao espaço interno (salão) para as atividades.

Completo: 0 %

Objetivo Específico: Ampliar o número de usuários por atividade, em ações simultâneas e diversificadas.

Atividades: Garantir ampliação do número de oficinas e usuários nas atividades.

Descrição:

Uso do salão, salas técnicas e salas de atividades no espaço interno.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Realização de atividades de convivência no espaço interno.

 Indicadores de Parceria

 Indicadores de Parceria

8º Mês | MAI/2025

1 | 1 banheiro feminino com 4 cabines adaptadas;

Descrição: Efetividade na distribuição dos espaços em atenção as normativas vigentes para a modalidade, garantindo conforto e acessibilidade aos usuários e funcionários.

Quantidade 4

Realizado no Mês: 0 (0%) | Não Realizado

Observações: Busca de novas parcerias para plena execução do projeto.

2 | 1 banheiro masculino com 2 cabines adaptadas e 2 mictórios;

Descrição: Efetividade na distribuição dos espaços em atenção as normativas vigentes para a modalidade, garantindo conforto e acessibilidade aos usuários e funcionários.

Quantidade 4

Realizado no Mês: 0 (0%) | Não Realizado

Observações: Busca de novas parcerias para plena execução do projeto.

3 | 1 banheiro unissex com acessibilidade;

Descrição: Efetividade na distribuição dos espaços em atenção as normativas vigentes para a modalidade, garantindo conforto e acessibilidade aos usuários e funcionários.

Quantidade 1

Realizado no Mês: 0 (0%) | Não Realizado

Observações: Busca de novas parcerias para plena execução do projeto.

4 | 2 banheiros vestiários para funcionários;

Descrição: Efetividade na distribuição dos espaços em atenção as normativas vigentes para a modalidade, garantindo conforto e acessibilidade aos usuários e funcionários.

Quantidade 2

Realizado no Mês: 0 (0%) | Não Realizado

Observações: Busca de novas parcerias para plena execução do projeto.

5 | 2 salas melhor adaptadas as necessidades do serviço no desenvolvimento de atividades em grupo e melhor aproveitamento do salão ampliando sua capacidade na recepção de usuários, familiares e comunidade.

Descrição:

Quantidade 2

Realizado no Mês: 0 (0%) | Não Realizado

Observações: Em andamento o processo de adequação do espaço

6 | Apresentação de relatório fotográfico.

Descrição:

Quantidade 1

Realizado no Mês: 0 (0%) | Não Realizado

Observações: Em andamento o processo de adequação do espaço.

7 | Apresentação do quadro de atividades ampliado.

Descrição:

Quantidade 1

Realizado no Mês: 0 (0%) | Não Realizado

Observações: Em planejamento a ampliação da oferta de atividades simultâneas, tendo em vista as melhorias no espaço, garantindo conforto e privacidade nas ações.

8 | Melhoria Sala Coordenação SCFV

Descrição: Salas adequadas ao desenvolvimento das ações em funcionamento;

Quantidade 1

Realizado no Mês: 0 (0%) | Não Realizado

Observações: Em andamento o processo de adequação do espaço

9 | Melhoria Sala Técnica (Orientadoras)

Descrição: Salas adequadas ao desenvolvimento das ações em funcionamento;

Quantidade 1

Realizado no Mês: 0 (0%) | Não Realizado

Observações: Em andamento o processo de adequação do espaço

10 | Melhoria Sala de Atividades Técnicas (Serviço Social)

Descrição: Salas adequadas ao desenvolvimento das ações em funcionamento;


Quantidade 1

Realizado no Mês: 0 (0%) | Não Realizado

Observações: Em andamento o processo de adequação do espaço

Galeria de Fotos

Item	Atividade Principal	Mês	Junho	Julho	Agosto	Setembro
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1	IMPLANTAÇÃO					
2	Contrato de obra e planejamento					
3	Leilão de materiais para compra					
4	Estudo e locação da obra					
5	Contrato de locação					
6	IMPLANTAÇÃO					
7	Estudo de viabilidade para externo					
8	Montagem de projeto					
9	Estudo e localização das áreas					
10	Estudo das condições de					
11	Estudo das condições de					
12	Estudo das condições de					
13	Estudo das condições de					
14	Estudo das condições de					
15	Estudo das condições de					
16	Estudo das condições de					
17	Estudo das condições de					
18	Estudo das condições de					
19	Estudo das condições de					
20	Estudo das condições de					
21	Estudo das condições de					
22	Estudo das condições de					
23	Estudo das condições de					
24	Estudo das condições de					
25	Estudo das condições de					
26	Estudo das condições de					
27	Estudo das condições de					
28	Estudo das condições de					
29	Estudo das condições de					
30	Estudo das condições de					
31	Estudo das condições de					
32	Estudo das condições de					
33	Estudo das condições de					
34	Estudo das condições de					
35	Estudo das condições de					
36	Estudo das condições de					
37	Estudo das condições de					
38	Estudo das condições de					
39	Estudo das condições de					
40	Estudo das condições de					
41	Estudo das condições de					
42	Estudo das condições de					
43	Estudo das condições de					
44	Estudo das condições de					
45	Estudo das condições de					
46	Estudo das condições de					
47	Estudo das condições de					
48	Estudo das condições de					
49	Estudo das condições de					
50	Estudo das condições de					
51	Estudo das condições de					
52	Estudo das condições de					
53	Estudo das condições de					
54	Estudo das condições de					
55	Estudo das condições de					
56	Estudo das condições de					
57	Estudo das condições de					
58	Estudo das condições de					
59	Estudo das condições de					
60	Estudo das condições de					
61	Estudo das condições de					
62	Estudo das condições de					
63	Estudo das condições de					
64	Estudo das condições de					
65	Estudo das condições de					
66	Estudo das condições de					
67	Estudo das condições de					
68	Estudo das condições de					
69	Estudo das condições de					
70	Estudo das condições de					
71	Estudo das condições de					
72	Estudo das condições de					
73	Estudo das condições de					
74	Estudo das condições de					
75	Estudo das condições de					
76	Estudo das condições de					
77	Estudo das condições de					
78	Estudo das condições de					
79	Estudo das condições de					
80	Estudo das condições de					
81	Estudo das condições de					
82	Estudo das condições de					
83	Estudo das condições de					
84	Estudo das condições de					
85	Estudo das condições de					
86	Estudo das condições de					
87	Estudo das condições de					
88	Estudo das condições de					
89	Estudo das condições de					
90	Estudo das condições de					
91	Estudo das condições de					
92	Estudo das condições de					
93	Estudo das condições de					
94	Estudo das condições de					
95	Estudo das condições de					
96	Estudo das condições de					
97	Estudo das condições de					
98	Estudo das condições de					
99	Estudo das condições de					
100	Estudo das condições de					

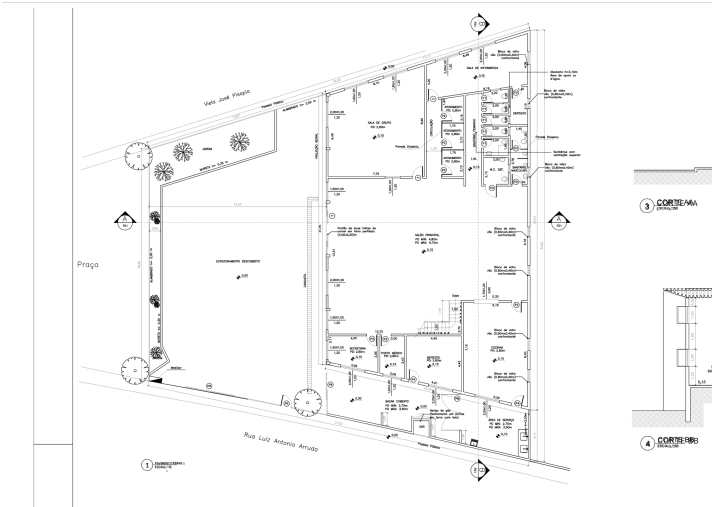

Outros Documentos

Nome	Observações	
------	-------------	--

Próximas Atividades

#	Atividade	Meta	Etapa	Descrição
---	-----------	------	-------	-----------

Conceição Ferreira Hipólito

Conceicao Ferreira Hipólito
 Autoridade Máxima da Entidade - Presidente
 CPF ***.343.438-**
 RG **.17.02*-*

Claudia

Claudia Fernanda Piteri
 Responsável Técnico
 CPF ***.042.678-**
 RG
